

A csoport tervezési munkájának ütemezése a helyi vidékfejlesztési stratégia elkészítéséhez

- jóváhagyásra előkészített javaslat -

A 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, mely az *Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról* szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről alapján 2008. január 4.-i ülésén az Akciócsoport tagjai megválasztották a tervezési csoport 7 tagját.

A csoport alakuló ülését 2008. január 11.-én megtartotta Sátoraljaújhelyen, s rögzítésre került, hogy az FVM és IH iránymutatásainak megjelenését követően ütemezés készül a tervezési munka mindenki számára átlátható tartalmáról és menetrendjéről. Jelen munkaterv ezen tervezési dokumentumok alapján készült.

Forrás:


http://www.zrva.hu/hvi_elemei/letoltesek/HVS_helyi%20tervezesi_folyamat_20080109.pdf

1. A tervezési csoport feladatai:

- a) a tervezési segédlet alapján az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett terület helyzetelemzéséhez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása;
- b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése;
- c) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülőfejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése;
- d) a tervezési időszak végén az elkészített tervnek az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára véleményezésre, majd jóváhagyásra történő benyújtása;
- e) az IH által rendelkezésre bocsátott elektronikus tervezési felület folyamatos frissítése;
- f) a csoport kötelezőképviselője az IH és az FVM VKSZI által szervezett tervezési képzéseken;
- g) a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel;
- h) a terv IH általi jóváhagyása után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a HVS-en való elvégzése.


2. A HVS tervezési folyamat összefoglaló ábrája:

HVS helyi tervezés lebonyolításának összefoglalója

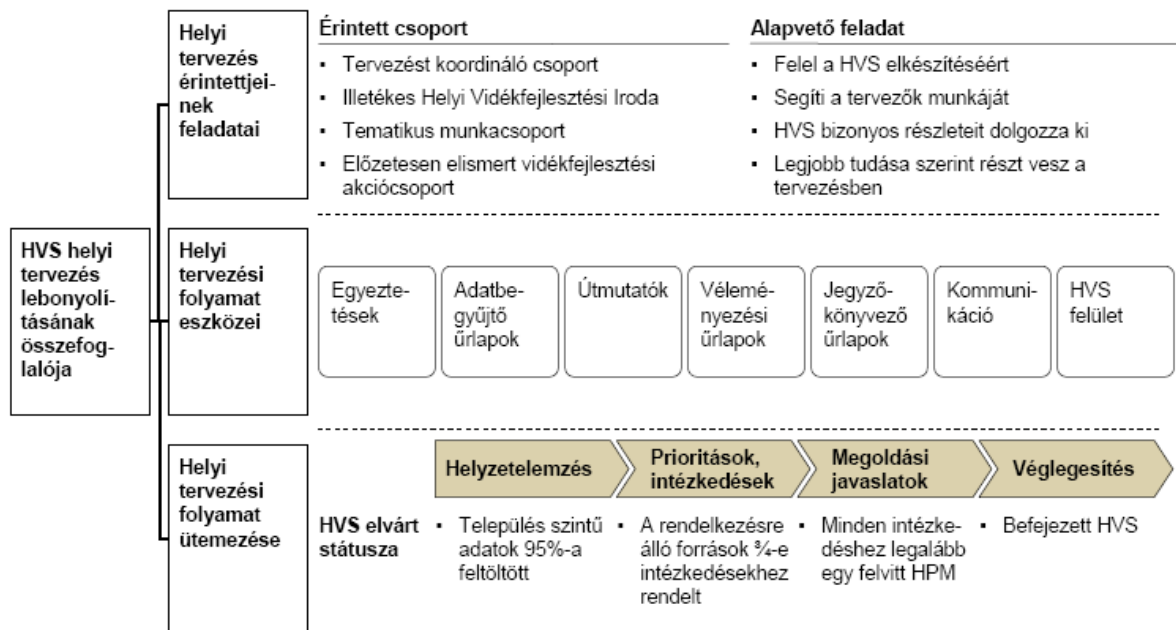

3. A tervezést koordináló csoport feladatai:

Tervezést koordináló csoport feladatai

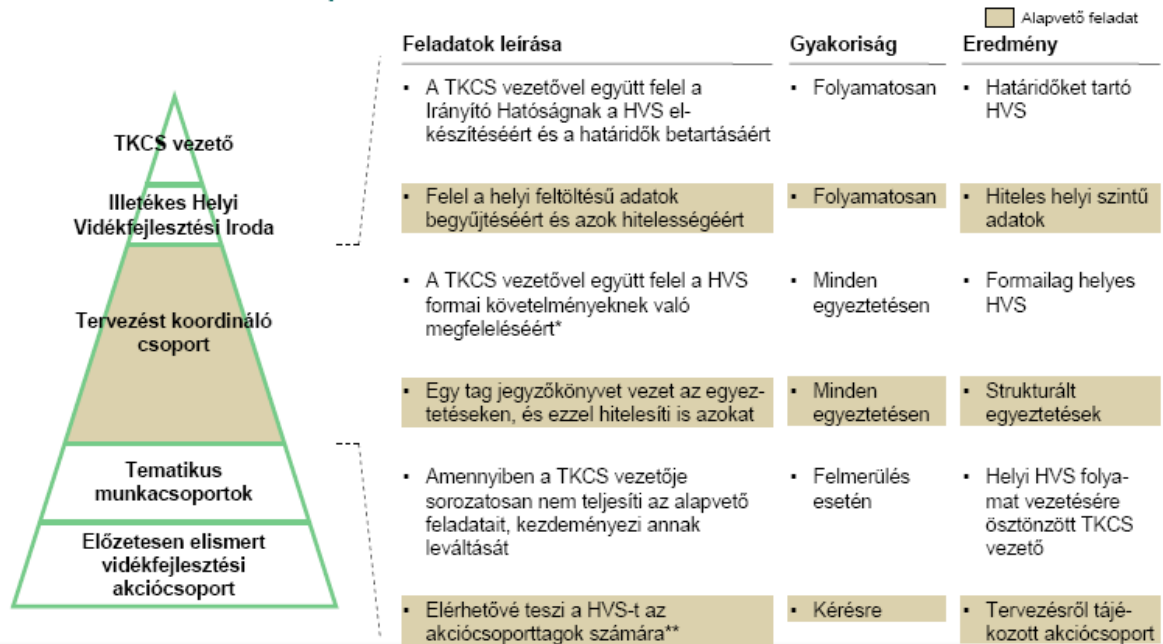

* Lásd HVS Tervezési Útmutató

** Legkésőbb az irásos kérelem benyújtásától számított harmadik napon

Forrás: EPAP elemzés

4. A TKCS tervezési munkájának ütemezése heti bontásban:

Az üléseket Sátoraljaújhelyben, a Zemplén Európa Házban pénteki napokon 9 órától tartjuk az alább jelzett időpontokban. Az ülésekről jegyzőkönyv készül.

Jegyzőkönyvvezető és annak tartalmát, az elfogadott részanyagokat az elektronikus tervezési felületre heti rendszerességgel felviszi, továbbá az érintett HVI irodák hirdetőtáblájukra kifüggesztik (illetékes HVI irodavezető: Pásztor Zsolt, Sárospatak).

1. ülés: január 11.

Megalakulás, bemutatkozás.

Az EMVA és az UMVP bemutatása.

A TKCS feladatai, ülésezési rendje.

Kistérségenkénti helyzetelemzés megkezdésének elindítása.

2. ülés: január 25.

A tervezési menet-és munkarend elfogadása a HVS helyi tervezési folyamat leírásának és heti bontású javasolt ütemezésének figyelembe vételével.

Helyzetelemzés 2. Térségi SWOT elemzés kialakítása, megvitatása.

Tervezési metodika megbeszélése.

Adatfeltöltés megkezdése az elektronikus felületre.

3. ülés: február 01.

Helyzetelemzés 3. Szabadszöveges kiegészítések elkészítése.

Adatfeltöltés megkezdése az elektronikus felületre.

4. ülés: február 08.

Helyzetelemzés 4. Szabadszöveges kiegészítések elkészítése.

Adatfeltöltés az elektronikus felületre.

Az elkészült helyzetelemzés megküldése e-mailben az ACS tagoknak.

5. ülés: február 15.

Helyzetelemzés lezárása

Az aktuális állapotú HVS bemutatása, megvitatása és elfogadtatása az akciócsoporthal.(1. prezentáció).

Egyeztetési jkv elkészítése és megküldése a régiós koordinátornak és az IH-nak.

6. ülés: február 22.

Prioritások és azokhoz kapcsolódó intézkedések kidolgozása, megbeszélése, elfogadása elsősorban az UMVP 3. és 4. tengelye alapján, a térségi sajátosságok figyelembe vételével.

7. ülés: február 29.

Prioritásokhoz tartozó intézkedések és azokhoz rendelt források és támogatási intenzitások kidolgozása.

8. ülés: március 07.

Prioritásokhoz tartozó intézkedések és azokhoz rendelt források és támogatási intenzitások kidolgozása és véglegesítése.

Szükség szerint szabadszöveges kiegészítések elkészítése, elfogadása és felvezetése.

Egyeztetési jkv. megküldése a régiós koordinátornak.

Aktuális HVS kiküldése e-mailben az ACS tagoknak.

9. ülés: március 14.

Az aktuális állapotú HVS bemutatása és elfogadtatása az akciócsoporttal. (2. prezentáció)

Amennyiben a HVS nem kerül elfogadásra, van lehetőség a prioritások , intézkedések módosítására. Egyeztetési jkv elkészítése.

Helyzetelemzés felületének lezárása.

10. ülés: március 21. (Virtuális ülés Nagypéntek miatt!!!)

Gazdaságfejlesztési javaslatok kidolgozása a sarospataki@hvi.hu címre (Pásztor Zsolt) elektronikusan megküldött tagi javaslatok felhasználásával. Elfogadásukra a március 28.-i ülésen fog sor kerülni.

11. ülés: március 28.

Szolgáltatás- falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok kidolgozása.

Prioritások és intézkedések igazítása a megoldási javaslatokhoz.

A 9. és a 10. ülésre előkészített javaslatok megvitatása és elfogadása.

12. ülés: április 04.

IV. (LEADER) tengely forrásaival kapcsolatos megoldási javaslatok kidolgozása.

Aktuális HVS kiküldése e-mailben az ACS tagoknak.

13. ülés: április 11.

Az aktuális állapotú HVS bemutatása és elfogadtatása az akciócsoporttal. (3. prezentáció)

Amennyiben a HVS nem kerül elfogadásra, van lehetőség a megoldási javaslatok módosítására. Egyeztetési jkv elkészítése.

Prioritások és intézkedések felületeinek lezárása.

14. ülés: április 18.

További megoldási javaslatok kidolgozása, ezek rögzítése.

15. ülés: április 25.

A megoldási javaslatokhoz tartozó szabadszöveges (speciálisan a térségre definiált) elemek kidolgozása.

HVS átvizsgálása, ellenőrzése.

16. ülés: május 02. (Virtuális ülés munkanap áthelyezés miatt!!!)

A teljes HVS átvizsgálása szakmai, formai és nyelvhelyességi szempontból, kitérve a horizontális elvek érvényesülésének vizsgálatára is.

Aktuális HVS kiküldése e-mailben az ACS tagoknak.

17. ülés: május 09.

A végleges állapotúnak szánt HVS bemutatása és elfogadtatása az akciócsoporttal. (4. prezentáció)

Amennyiben a HVS nem kerül elfogadásra, van lehetőség a megoldási javaslatok rendkívüli módosítására. Ezt az egyeztetési jkv-ben rögzítjük.

Megoldási javaslatok felületeinek végleges lezárása.

5. A TKCS munkarendjének elvei:

A TKCS tevékenységét a hivatkozott FVM rendelet és a „HVS helyi tervezés folyamata” c. dokumentum és metodikai előírások, kiadott űrlapformátumok szerint, a tagok legjobb szaktudása alapján végzi.

A választott tagok képviselői ülésenként változhatnak, de ehhez megbízólevelet kell hozniuk.

A TKCS döntéseiben – a kistérségi munkacsoportok javaslatainak alapos mérlegelése alapján - az akciócsoport teljes területének fejlesztési érdekeit tekinti elsődlegesnek.

A TKCS döntéseit, az akciócsoport felé készülő prezentációkat igyekszik konszenzussal kialakítani, s csak többségi támogató szavazattal bíró javaslatokat terjeszt a TKCS vezető az ACS gyűléseken elő.

A TKCS tervezési feladatának hiánytalan elvégzéséhez - amennyiben az a munka elhúzódása miatt indokoltá válik - a 4.pontban tervezett időpontokon túl, további ülések összehívására is sor kerülhet, amennyiben ezt a tagok többségi szavazással elfogadják.

6. A TKCS vezető fogadónapjai és helyszínei:

A fogadónapok a TKCS ülésnapjain kerülnek megtartásra, olyan formában, hogy péntekenként 8.30-12.00-ig Sátoraljaújhelyben az Európa Ház I. emeleti HVI irodájában, míg 13.00-16.00-ig Sárospatakon a HVI irodában a TKCS vezető, vagy helyettese és a helyet adó HVI iroda vezetője várja az érdeklődőket.

Sárospatak 2008. január 22.

Dr. Dankó László sk.
TKCS vezető
