

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA ***(HPME)***



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

A HVS FELÉPÍTÉSE

1. Helyzetelemzés települési szinten (adatbevétel)

2. Fő fejlesztési prioritások és intézkedések

3. Megoldási javaslatok (HPME-k)

- a) Helyi gazdaságfejlesztési terv
- b) Helyi szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési terv
- c) IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv

4. Szabadszöveges tervezői kiegészítés

- a) Helyzetelemzés
- b) Fő fejlesztési prioritások és intézkedések
- c) Megoldási javaslatok

5. Központi, országos adatbevétel




A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

A HVS kidolgozására rendelkezésre álló 120 nap (17 hét) elegendő lesz, amennyiben a tervezők szigorúan ütemezik a feladatokat, és betartják a határidőket



HVS helyi tervezési folyamatnak a HVS értékelésében is számon kért mérföldkövei*

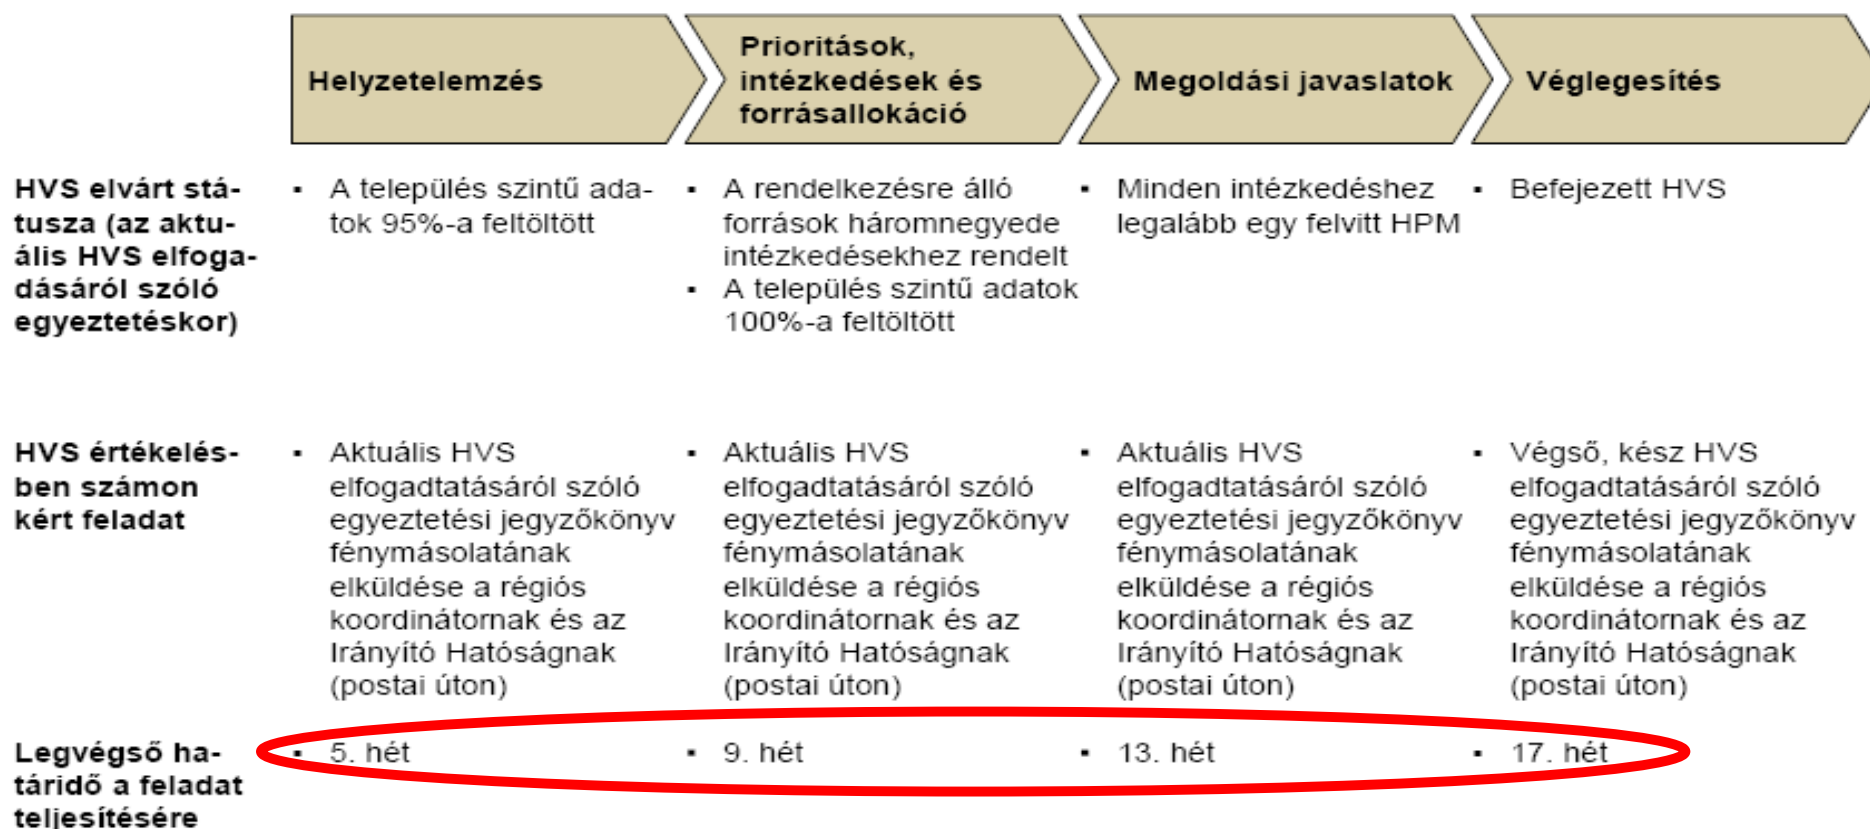

* A mérföldkövek kötelezően számon kért teljesítményt várnak el, ugyanakkor a következőkben bemutatott heti bontású ütemterv csak ajánlás
 Forrás: EPAP elemzés

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

I. MÉRFÖLDKŐ: HELYZETELEMZÉS

A HVS elvárt státusza (az aktuális HVS elfogadásáról szóló egyeztetéskor):

- település szintű adatok 95%-a feltöltött.

HVS értékelésben számon kért feladat:

- az aktuális HVS elfogadtatásáról szóló egyeztetési jegyzőkönyv elküldése a régiós koordinátornak és az Irányító Hatóságnak.

A feladat teljesítésének határideje:

- 5. hét, 2008.04.13., vasárnap



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

II. MÉRFÖLDKŐ: PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK

A HVS elvárt státusza (az aktuális HVS elfogadásáról szóló egyeztetéskor):

- prioritások és intézkedések kidolgozása,
- település szintű adatok 100%-a feltöltött.

HVS értékelésben számon kért feladat:

- az aktuális HVS elfogadtatásáról szóló egyeztetési jegyzőkönyv elküldése a régiós koordinátornak és az Irányító Hatóságnak.

A feladat teljesítésének határideje:

- 9. hét, 2008.05.11., vasárnap



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

III. MÉRFÖLDKŐ: MEGOLDÁSI JAVASLATOK, FORRÁSALLOKÁCIÓ

A HVS elvárt státusza (az aktuális HVS elfogadásáról szóló egyeztetéskor):

- a rendelkezésre álló források $\frac{3}{4}$ -e HPME-khez kötött.

HVS értékelésben számon kért feladat:

- az aktuális HVS elfogadtatásáról szóló egyeztetési jegyzőkönyv elküldése a régiós koordinátornak és az Irányító Hatóságnak.

A feladat teljesítésének határideje:

- 13. hét, 2008.06.08., vasárnap



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

IV. MÉRFÖLDKŐ: VÉGLEGESÍTÉS

A HVS elvárt státusza (az aktuális HVS elfogadásáról szóló egyeztetéskor):

- befejezett HVS.

HVS értékelésben számon kért feladat:

- a kész HVS elfogadtatásáról szóló egyeztetési jegyzőkönyv elküldése a régiós koordinátornak és az Irányító Hatóságnak.

A feladat teljesítésének határideje:

- 17. hét, 2008.07.06., vasárnap

