

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA - PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK -



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

A HVS FELÉPÍTÉSE

1. Helyzetelemzés települési szinten (adatbevétel)

2. Fő fejlesztési prioritások és intézkedések

3. Megoldási javaslatok (HPM-ek)

- a) Helyi gazdaságfejlesztési terv
- b) Helyi szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési terv
- c) IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv

4. Szabadszöveges tervezői kiegészítés

- a) Helyzetelemzés
- b) Fő fejlesztési prioritások és intézkedések
- c) Megoldási javaslatok

5. Központi, országos adatbevétel




A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

A HVS kidolgozására rendelkezésre álló 120 nap (17 hét) elegendő lesz, amennyiben a tervezők szigorúan ütemezik a feladatokat, és betartják a határidőket



HVS helyi tervezési folyamatnak a HVS értékelésében is számon kért mérföldkövei



**HVS elvart stá-
tusza (az aktu-
ális HVS elfoga-
dásáról szóló
egyeztetéskor)**

- A település szintű ada-
tok 95%-a feltöltött
- A rendelkezésre álló
források háromnegyede
intézkedésekhez rendelt
- A település szintű adatok
100%-a feltöltött
- Minden intézkedéshez
legalább egy felvitt HPM
- Befejezett HVS

**HVS értékelés-
ben számon
kért feladat**

- Aktuális HVS
elfogadtatásáról szóló
egyeztetési jegyzőkönyv
fénymásolatának
elküldése a régiós
koordinátornak és az
Irányító Hatóságnak
(postai úton)
- Aktuális HVS
elfogadtatásáról szóló
egyeztetési jegyzőkönyv
fénymásolatának
elküldése a régiós
koordinátornak és az
Irányító Hatóságnak
(postai úton)
- Aktuális HVS
elfogadtatásáról szóló
egyeztetési jegyzőkönyv
fénymásolatának
elküldése a régiós
koordinátornak és az
Irányító Hatóságnak
(postai úton)
- Végző, kész HVS
elfogadtatásáról szóló
egyeztetési jegyzőkönyv
fénymásolatának
elküldése a régiós
koordinátornak és az
Irányító Hatóságnak
(postai úton)

**Legvégső ha-
táridő a feladat
teljesítésére**

- 5. hét
- 9. hét
- 13. hét
- 17. hét

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRUKTÚRÁJA

A **prioritások** és az alájuk tartozó **intézkedések** megadásával vázolhatjuk fel a helyi vidékfejlesztési stratégia fő **irányvonalait**.

Az intézkedések alatt elhelyezkedő **megoldási javaslatok (HPM-ek)** a konkrét fejlesztési javaslatokat jelentik.



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A **prioritásokkal** a **legtágabb fejlesztési célok** adhatók meg, például:

- *Helyi szőlő és bor ágazat fejlesztése.*

Az **intézkedések** valamivel **szűkebb kört** határoznak meg, például:

- *Helyi szőlő- és bortermelés minőségének javítása és standardizálása és/vagy A borok helyi szintű feldolgozásának fejlesztése és/vagy Kistermelői borok értékesítésének növelése.*



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A prioritásokból javasolt többet is megadni, de az **ajánlott mennyiség 6-10** körül mozog.

Minden prioritáshoz meg kell jelölni **fejlesztési intézkedéseket** is, amelyekből **prioritásonként több** is megadható, de legalább egy szükséges.



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK


A ***megoldási javaslatok*** a HVS részletesebb kifejtésére szolgálnak, amelyeket a ***fejlesztési intézkedésekhez és az azokhoz tartozó prioritásokhoz kell illeszteni.***

Egy-egy intézkedéshez több megoldási javaslat is megadható, de legalább egy szükséges.

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRUKTÚRÁJA

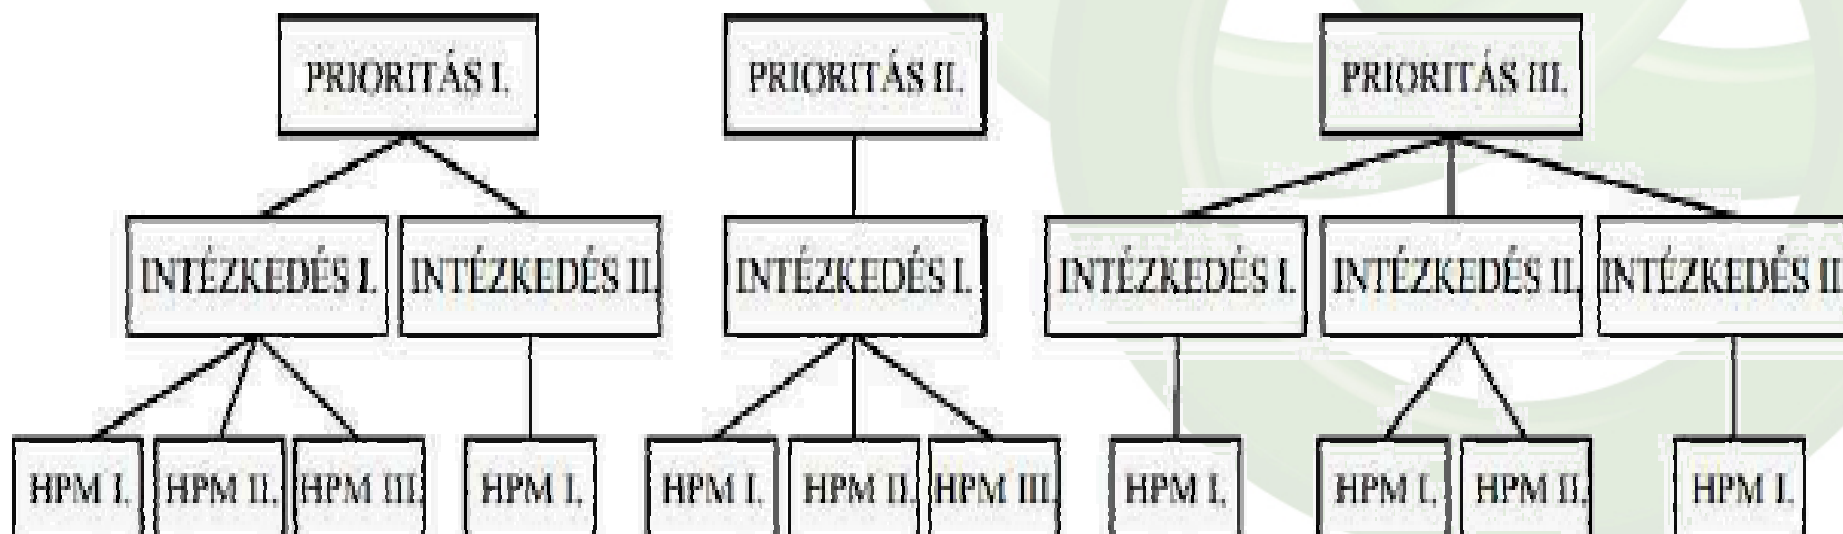

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

Minden térség rendelkezésére áll bizonyos nagyságú **tervezett forrás**, amelyre optimalizálva érdemes végrehajtani a tervezést.

Ezért ***nem mindegy, hogy milyen és mennyi prioritást és intézkedést választunk.***



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A források allokálása intézkedési szinten történik, vagyis minden egyes intézkedéshez meg kell adni, hogy milyen összeget kíván a térség az adott témával kapcsolatban felhasználni.

Ezek segítségével azt jelölhetjük meg, hogy a különféle csoportok (kedvezményezett) a beruházások teljes összegének ***hány százalékát kapják meg támogatás gyanánt.***

A stratégiák megvalósításakor ezek az összegek és arányok számon kérhetők!



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

A prioritások és intézkedések kidolgozásakor, próbáljunk **minél integráltabb fejlesztéseket** megvalósítani, mert az összetett fejlesztések lehetnek sikeresek és **hosszútávon fenntarthatók**.

Ha például a helyi szintű turizmust szeretnénk serkenteni, akkor a terv **minél több olyan fejlesztést** foglaljon magába, **ami turisztikai szempontból növekedési potenciált rejt magában**.



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

Például:

Prioritás: Helyi turizmus fejlesztése

Intézkedés: Bor- és gasztronómiai turizmus fejlesztése

Ehhez illeszthető komplementer prioritás és intézkedés:

Prioritás: Helyi szőlő és bor ágazat fejlesztése

Intézkedés: Helyi szőlő és bortermelés minőségének javítása és standardizálása.

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

A PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK SZABADSZÖVEGES ELEMEI

A prioritások és intézkedések felviteléhez tartozik **két szabadszöveges elem:**

- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia egymondatos címe
Amikor a prioritások és intézkedések felületei megnyílnak, megadhatóvá válik a HVS címe is.
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapvető célja
Ez egy olyan jövőkép leírása, mely a fejlesztések megvalósulása esetén jön létre.



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

A PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK SZABADSZÖVEGES ELEMEI

A prioritások és intézkedések felviteléhez tartozik **két szabadszöveges elem**:

- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapvető célja

Az alapvető célhoz kapcsolódóan hivatkozni kell a térség fontos **problémáira** és **lehetőségeire**, illetve ki kell térni az **esélyegyenlőség** és **fenntarthatóság** érvényesülésére a stratégiában.

További fontos szempontként megemlítendő a helyi közösség területén **a fejlettségi szintben tapasztalható egyenlőtlenségek kezelése**.



A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

A 6. héten a térség legfontosabb feladata prioritások és intézkedések kidolgozása



HVS helyi tervezési folyamat – Prioritások, intézkedések és forrásallokáció 1/4



	Érintettek	Feladat(ok) leírása	Eredmény	
6. hét				
7. hét				
8. hét				
9. hét				
	Egyeztetés a prioritásokról és az intézkedésekről	<ul style="list-style-type: none"> TKCS és a témában illetékes akció- és munkacsoporttagok 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritások és azokhoz tartozó intézkedések kidolgozása Egyeztetési időpont keresés további intézkedések forrásallokációval történő kidolgozására a következő héten 	<ul style="list-style-type: none"> Kidolgozott új prioritások és intézkedések Fix időpont további intézkedések forrásallokációval történő kidolgozására
	Egyéb teendők	<ul style="list-style-type: none"> TKCS egy tagja - 	<ul style="list-style-type: none"> Jegyzőkönyv készítés - 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentált egyeztetés -
	HVS feltöltés	<ul style="list-style-type: none"> TKCS vezető 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritások, intézkedések és egyéb módosítások feltöltése 	<ul style="list-style-type: none"> A hét eseményeit tükröző HVS
	Kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"> TKCS vezető 	<ul style="list-style-type: none"> Következő heti egyeztetés meghirdetése az intézkedések forrásallokációval történő kidolgozására (kör-email, kifüggesztés) 	<ul style="list-style-type: none"> Következő heti egyeztetés időpontjáról értesült akciócsoport

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

A 7. héten a térség legfontosabb feladata további intézkedések kidolgozása forrásallokációval



HVS helyi tervezési folyamat – Prioritások, intézkedések és forrásallokáció 2/4



	Érintettek	Feladat(ok) leírása	Eredmény
6. hét			
7. hét	<ul style="list-style-type: none"> TKCS és a témában illetékes akció- és munkacsoporttagok 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritásokhoz tartozó intézkedések és azokhoz rendelt források és támogatási intenzitások kidolgozása Prioritások igazítása az intézkedésekhez Egyeztetési időpont keresés további intézkedések forrásallokációval történő kidolgozására a következő héten 	<ul style="list-style-type: none"> Kidolgozott intézkedések, forrásallokáció és támogatási intenzitások Folyamatosan koherens HVS Fix időpont további intézkedések forrásallokációval történő kidolgozására
8. hét	<ul style="list-style-type: none"> TKCS egy tagja - 	<ul style="list-style-type: none"> Jegyzőkönyv készítés - 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentált egyeztetés -
9. hét	<ul style="list-style-type: none"> TKCS vezető TKCS vezető 	<ul style="list-style-type: none"> Intézkedések, forrásallokáció és egyéb módosítások feltöltése Következő heti egyeztetés meghirdetése az intézkedések forrásallokációval történő kidolgozására (kör-email, kifüggesztés) 	<ul style="list-style-type: none"> A hét eseményeit tükröző HVS Következő heti egyeztetés időpontjáról értesült akciócsoport
	Egyeztetés az intézkedésekről és a forrásallokációról		
	Egyéb teendők		
	HVS feltöltés		
	Kommunikáció		

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

A 8. héten a térség legfontosabb feladata további intézkedések kidolgozása forrásallokációval és véglegesítése, illetve az aktuális HVS kiküldése az ACS-nak



HVS helyi tervezési folyamat – Prioritások, intézkedések és forrásallokáció 3/4



	Érintettek	Feladat(ok) leírása	Eredmény
6. hét	<p>Egyeztetés az intézkedésekről és a forrásallokációról II.</p>	<ul style="list-style-type: none"> TKCS és a témában illetékes akció- és munkacsoporttagok 	<ul style="list-style-type: none"> Első körben végleges intézkedések, forrásallokáció és támogatási intenzitások
7. hét		<ul style="list-style-type: none"> Prioritásokhoz tartozó intézkedések és azokhoz rendelt források és támogatási intenzitások kidolgozása és véglegesítése Prioritásokhoz kapcsolódó két szabadszöveges elem kidolgozása 	<ul style="list-style-type: none"> Pri.-okhoz tartozó szabadszöveges elemek készek
8. hét	<p>Egyéb teendők</p>	<ul style="list-style-type: none"> Egyeztetési időpont keresés az aktuális HVS elfogadtatására a következő héten TKCS egy tagja Jegyzőkönyv készítés 	<ul style="list-style-type: none"> Fix időpont a prioritások, intézkedések és a forrásallokáció elfogadtatására Dokumentált egyeztetés
9. hét	<p>HVS feltöltés</p>	<ul style="list-style-type: none"> ACS Részt vesznek a HVI, vagy TKCS vezető fogadónapján és megvizsgálják az aktuális HVS-t 	<ul style="list-style-type: none"> HVS aktuális állapotáról értesült akciócsoport
	<p>Kommunikáció</p>	<ul style="list-style-type: none"> TKCS vezető Új intézkedések, forrásallokáció és egyéb módosítások feltöltése Következő heti egyeztetés meghirdetése az aktuális HVS elfogadtatásáról (telefon, kifüggesztés) TKCS vezető Aktuális HVS kiküldése az ACS-nak (kör-email) 	<ul style="list-style-type: none"> A hét eseményeit tükröző HVS Következő heti egyeztetés időpontjáról értesült akciócsoport HVS aktuális állapotáról értesült akciócsoport

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

A 9. héten a térség legfontosabb feladata az aktuális HVS elfogadtatása



HVS helyi tervezési folyamat – Prioritások, intézkedések és forrásallokáció 4/4



Mérföldkö II.

	Érintettek	Feladat(ok) leírása	Eredmény
<p>6. hét</p> <p>7. hét</p> <p>8. hét</p> <p>9. hét</p>	<p>Egyeztetés az aktuális HVS elfogadtatásáról</p> <ul style="list-style-type: none"> TKCS és a teljes akciócsoport 	<ul style="list-style-type: none"> Az aktuális HVS bemutatása – kitérve a horizontális elvekre – és elfogadtatása* Egyeztetési időpont keresés a gazdaságfejlesztési megoldási javaslatokról a következő héten 	<ul style="list-style-type: none"> A teljes akciócsoport által ismert és elfogadott HVS Fix időpont a gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok kidolgozására
	<p>Egyéb teendők</p> <ul style="list-style-type: none"> TKCS egy tagja TKCS vezető 	<ul style="list-style-type: none"> Jegyzőkönyv készítés Az aktuális HVS elfogadásáról szóló egyeztetési jegyzőkönyv fénymásolatának elküldése a régiós koordinátornak és az IH-nak (posta) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentált egyeztetés A HVS elfogadásáról tájékozott régiós koordinátor és Irányító Hatóság
	<p>HVS feltöltés</p> <ul style="list-style-type: none"> TKCS vezető 	<ul style="list-style-type: none"> Megoldási javaslatok, és egyéb módosítások feltöltése 	<ul style="list-style-type: none"> A hét eseményeit tükröző HVS
	<p>Kommunikáció</p> <ul style="list-style-type: none"> TKCS vezető 	<ul style="list-style-type: none"> Következő heti egyeztetés meghirdetése a gazdaságfejlesztési megoldási javaslatokról (kör-email, kifüggesztés) 	<ul style="list-style-type: none"> Következő heti egyeztetés időpontjáról értesült akciócsoport
	<p>HVS felület</p> <ul style="list-style-type: none"> Irányító Hatóság 	<ul style="list-style-type: none"> Helyzetelemzés felületeinek lezárása** 	<ul style="list-style-type: none"> Véglegesen lezárt helyzetelemzés

A HVS TERVEZÉSI FOLYAMATA

FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

Részletes heti ütemezés megtekinthető:

**a „HVS tervezés folyamata, ütemezése” dokumentum
28-as oldalától.**

Link:

http://www.zrva.hu/hvi_elemei/letoltesek/HVS_helyi%20tervezesi_folyamat_20080109.pdf

